


Übersicht Projektstand St. Nikolaus Schule - Kall

Phase 0

ARBEITSKREIS SCHULEN - 21.05.2026



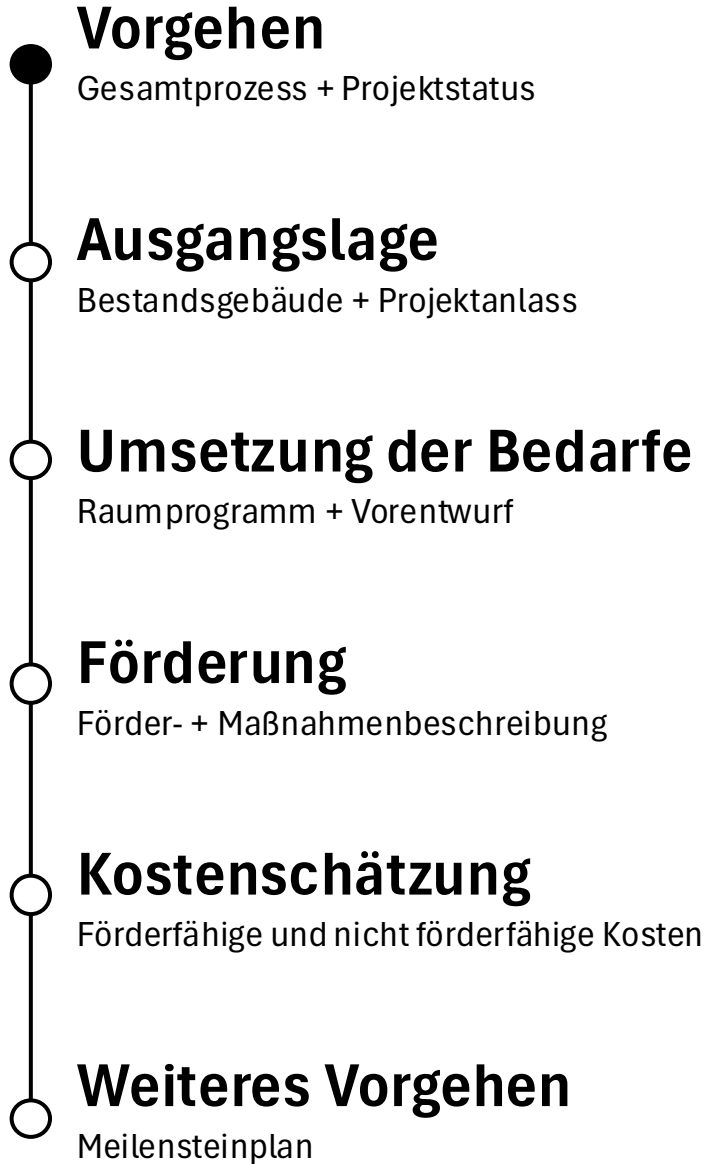

VORGEHEN

AHO



HOAI




Kick-off
Lenkungskreis



Bestandsanalyse



Bedarfsermittlung





Raumprogramm

VORGEHEN

AHO



HOAI



**Einreichung
Förderantrag am**
15.05.2026



2021

FLUTSCHÄDEN

Große Teile des **Erdgeschosses** bereits **saniert** / wiederhergestellt (Therapiebecken nicht wieder in Betrieb genommen)

Untergeschoss nicht nutzbar, Heizungsversorgung provisorisch

Außenanlagen noch nicht vollständig hergestellt (u.a. keine Spielgeräte)

2024

ERGEBNISSE SCHULENTWICKLUNGSPLANUNG

Deutliches Raumdefizit und **funktionale Überlastung des Bestandsgebäudes** → Erheblicher Handlungs- und Investitionsbedarf

Fehlende und **unzureichende Raumangebote**

Räume unterschreiten Sollgrößen

Infrastruktur- und Qualitätsdefizite (eingeschränkte Barrierefreiheit)

Empfehlung zur Auslagerung einer Stufe, da Mehrbedarfe im bestehenden Schulgebäude nicht gedeckt werden können

2025

WIRTSCHAFTLICHKEITSBETRACHTUNG | VORSTUDIE ZUR BAULICHEN WEITERENTWICKLUNG DER FÖRDERSCHULEN KREIS EUSKIRCHEN

Prüfung der baulichen und baurechtlichen **Umsetzbarkeit des annahmenbasierten Raummehrbedarfs**

Teilanbauten am Standort sowie Nutzung eines nahegelegenen Potenzialgrundstücks grundsätzlich möglich, Außenstandort für einzelne Klassen, Fachräume oder gesamte Stufe organisatorisch nur schwer umsetzbar

Gebäudeaufstockung als bevorzugte Variante zur Schonung der begrenzten Außen- und Schulhofflächen

heute

PHASE NULL | LEISTUNGSPHASEN 1+2 INKL. FÖRDERANTRAGSSTELLUNG

Raumweise Analyse des Bestands und **detaillierte Flächenbedarfsermittlung** mit den Lehrpersonal


Bestandsanalyse und Identifikation **baulicher und energetischer Handlungsbedarfe** durch Fachplaner

Planung der baulichen Umsetzung

Einbindung des Förderprogramms „Energetische Sanierung kommunaler Gebäude“ im Rheinischen Revier

AUSGANGSLAGE | ORGANISATION DER SCHULE

Objekt	St.-Nikolaus-Schule
Adresse	Weierbenden 9, 53925 Kall
Förderschwerpunkt	Geistige Entwicklung (50% der SuS mit intensivpädagogischer Förderung)
Betreuungskonzept	Ganztagsbetrieb mit Mittagsverpflegung in den Klassen
Klassensystem	Unterstufe, Mittelstufe, Oberstufe, Berufspraxisstufe


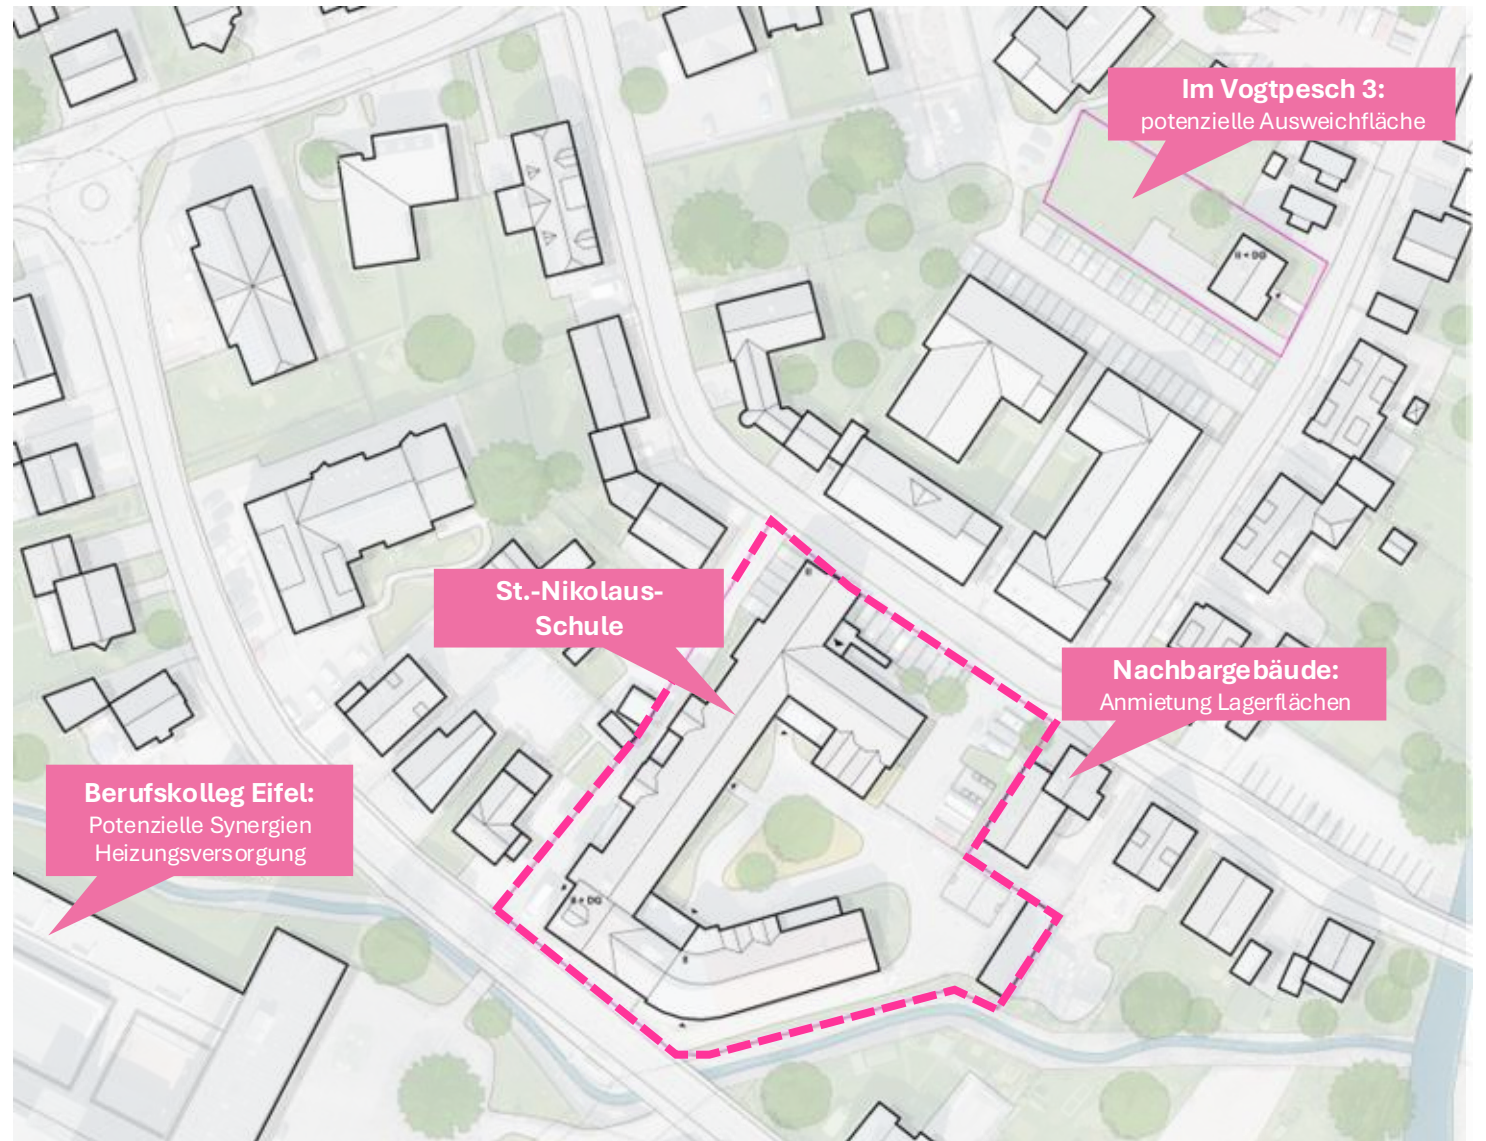



AUSGANGSLAGE | OBJEKTBESCHREIBUNG

Geschosse	2,5
Bauweise	Massiv
Grundstücksgröße	4.981 m ²
Bruttogrundfläche	3.671 m ² oberirdisch 3.987 m ² inkl. UG
Baujahr	1952-2011 (laufende Sanierungsmaßnahmen im Zuge von Flutschäden 2021)
Energieverbrauch	ca. 300 kWh/m ² *a



AUSGANGSLAGE | BAUHISTORIE

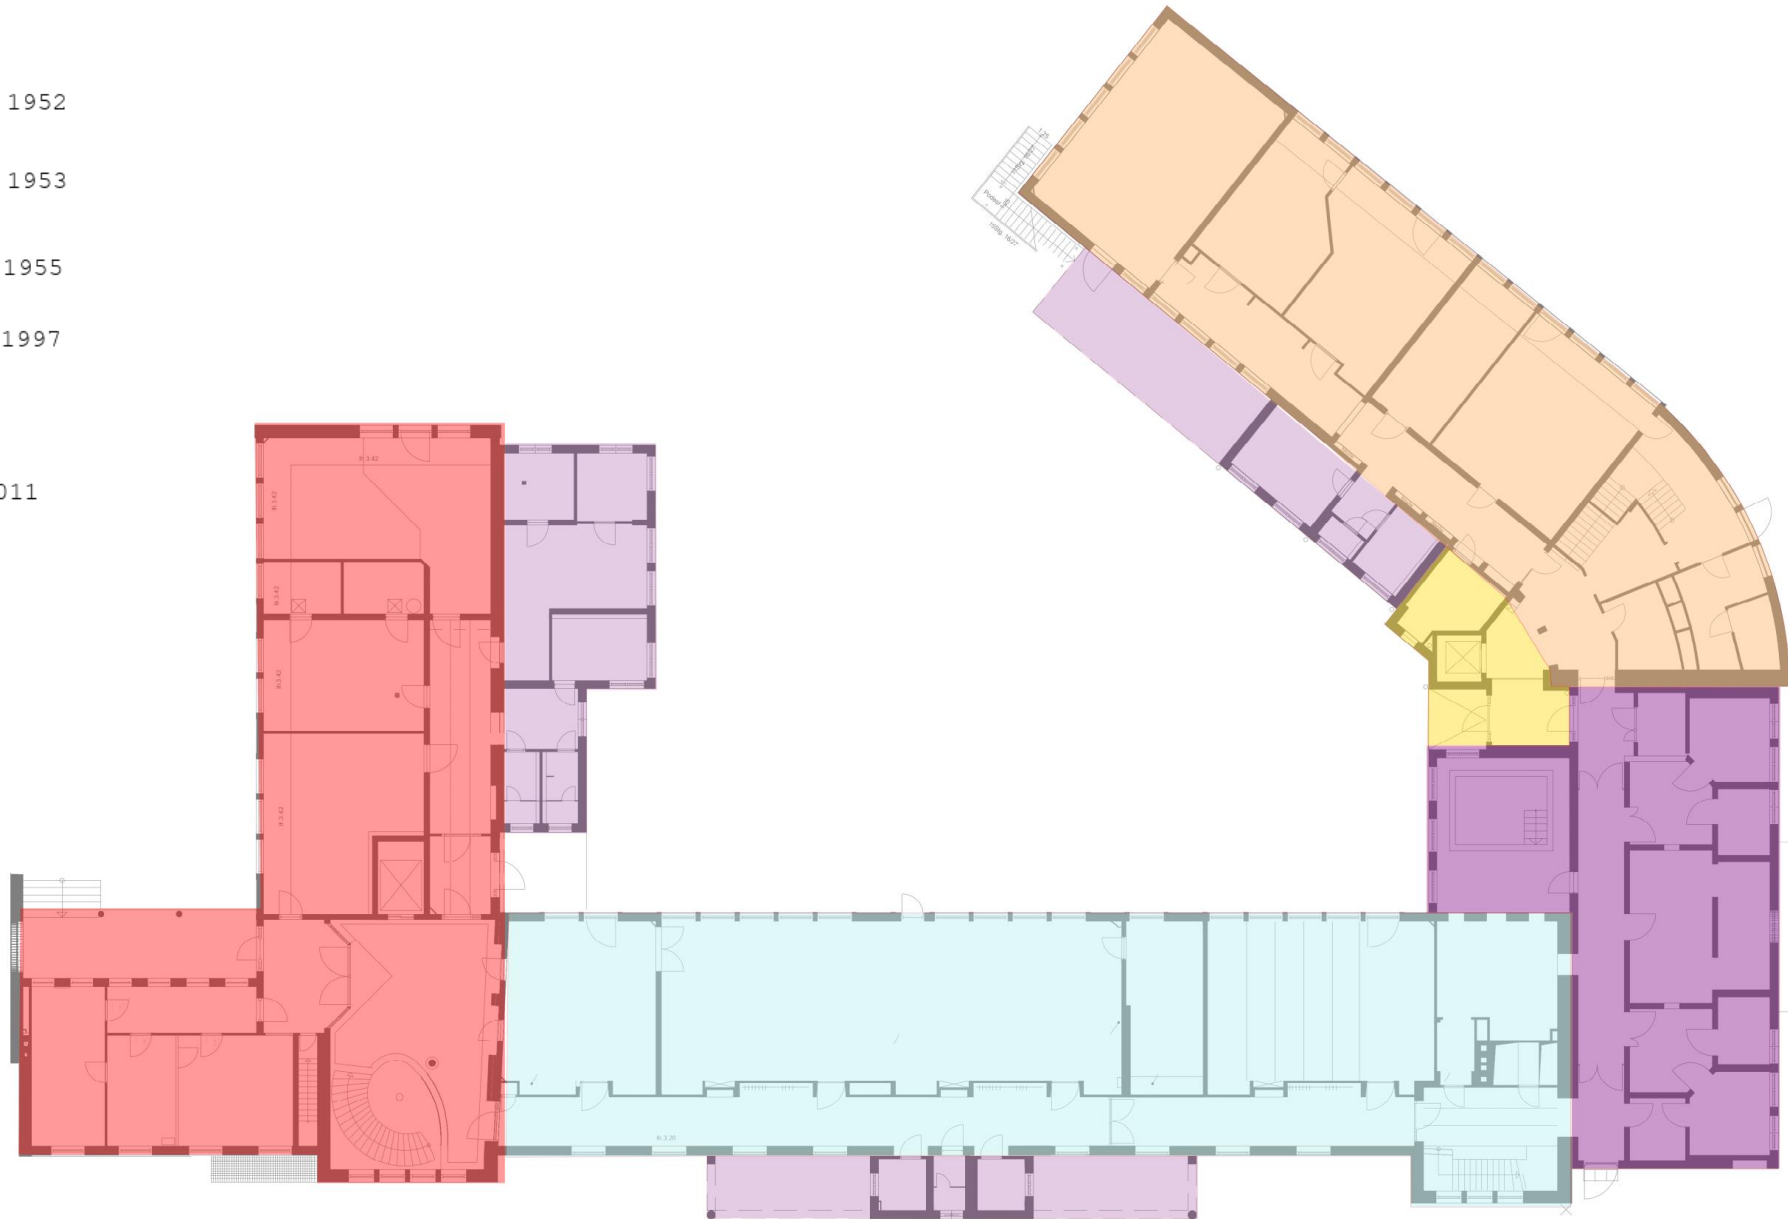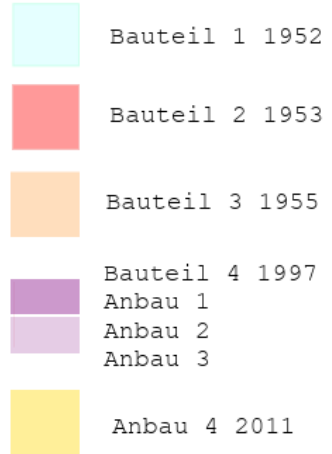

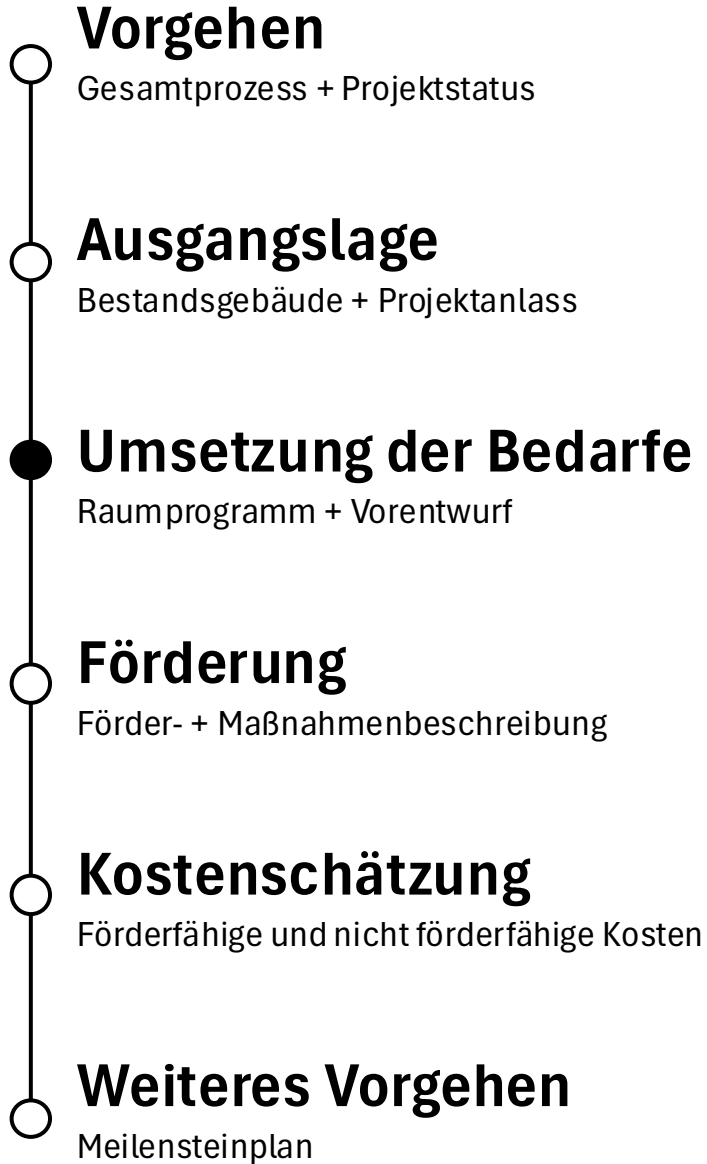

BERECHNUNGSGRUNDLAGE RAUMPROGRAMM

		Schuljahr 25/26 (Stand 10/2025)		
	Jahrgang	Schüler*innen / Kl	Klassen	Schüler*innen
Unterstufe	1,2,3,4	11	2	22
Mittelstufe	5,6,7	12,5	2	25
Oberstufe	8,9,10	11,5	2	23
Berufspraxisstufe	11,12,13	11	2	22
SNS Gesamt			8	92

		Prognose Schuljahr 2026/2027		
	Jahrgang	Schüler*innen / Kl	Klassen	Schüler*innen
SNS Gesamt	1-13	13,13	8	105
Klassenfrequenz gem. Vorentwurfsplanung				
SNS Gesamt	1-13	8,75	12	105

Personal (Stand 04/2026)	
Stelle	Anzahl
Lehrkräfte	27
MPT-Kraft	1
Schulbegleitungen	24
FSJ-lerinnen	3 (5 Stellen verfügbar)
Therapeutinnen	5
Krankenschwester	1 (2 Menschen teilen sich die Stelle)
Schulsozialarbeiterin	1
Hausmeister	2
Gesamt	64

In Spitzenzeiten sind pro Tag ca. 52 Personen an der Schule anwesend

- ➔ Schülerzahlen steigend, Prognosen aus dem Schulentwicklungsplan (2024) sind bereits überholt
- ➔ Vorentwurfsplanung enthält Puffer für weiter steigende Schülerzahlen bis zur Erreichung des Klassenfrequenzrichtwerts bzw. Klassenräume im Bestand sind kleiner als im SEP vorgesehen


	Schüler*innen				Klassenfrequenz-richtwert 10		Klassenfrequenz-höchstwert 13	
	Primar-stufe	Sekun-darstufe I	Berufs-praxis-stufe	Gesamt	Kl.	Klfrequ.	Kl.	Klfrequ.
2025	20	44	22	86	9	9,6	7	12,6
2026	20	46	22	88	9	9,8	7	12,7
2027	20	47	22	89	9	9,9	7	11,5
2028	20	49	23	92	9	10,2	8	11,6
2029	20	50	23	93	9	10,3	8	11,8
2030	20	50	24	94	9	10,4	8	12,0
2031	20	51	25	96	10	9,6	8	12,0
2032	20	51	25	96	10	9,6	8	12,0
2033	19	51	26	96	10	9,6	8	12,0
2034	19	50	27	96	10	9,6	8	12,3

PÄDAGOGISCHE BEDARFE


Pädagogisches Zielbild (Fragen und Diskussionen)





Schulische Abläufe (Darstellung eines typischen Schultags)

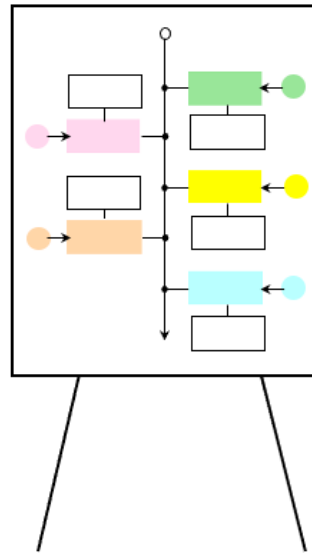

Zielbild Funktionsdiagramm (Funktionsanordnung inkl. Zusammenhänge)

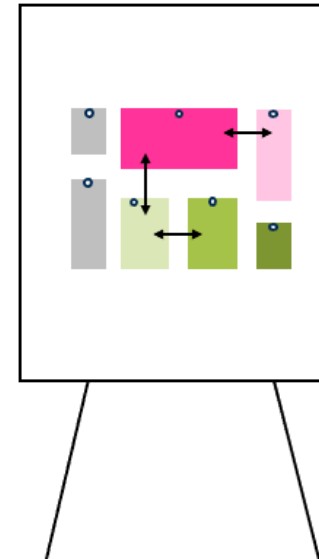

Notwendige Räume inkl. Priorisierung (basierend auf Struktur des Schulentwicklungsplans)



Erster Entwurf Raumprogramm Unterrichts- / und Gemeinschaftsbereiche

RAUMPROGRAMM BESTAND

Raum	Anzahl	Ø Raumgröße	Flächenbedarf (NUF)
KLASSENEINHEIT			
Klassenraum	8	49,82 m²	398,52 m²
Gruppenraum	8	24,92 m²	199,35 m²
Nebenraum / Differenzierungsraum	2	18,76 m²	37,51 m²
GEMEINSCHAFTSRÄUME			
Sportraum / MZR	1	141,99 m²	141,99 m²
Geräteraum (für Sportraum)	2	36,45 m²	72,90 m²
Pausenraum / Bücherei / Theaterraum	1	69,76 m²	69,76 m²
Lehrküche	1	58,69 m²	58,69 m²
Werkraum	1	64,83 m²	64,83 m²
Maschinenraum	1	23,82 m²	23,82 m²
Fahrrad-Reparaturraum	1	48,78 m²	48,78 m²
Musikraum	1	48,42 m²	48,42 m²
zus. Unterrichtsraum	2	32,02 m²	64,04 m²
zus. Gruppenraum	1	26,44 m²	26,44 m²
Computerraum	1	38,26 m²	38,26 m²
Trainingswohnung inkl. Nebenräume	1	102,93 m²	102,93 m²
THERAPIE- UND FÖRDERRÄUME			
Krankengymnastik-Raum	1	39,62 m²	39,62 m²
Therapie-Becken	1	38,76 m²	38,76 m²
Matschraum & Nebenraum	1	36,88 m²	36,88 m²
Inselraum / Sprachtherapie / Differenzierungsraum	1	30,43 m²	30,43 m²
Time-Out- / Reizreduzierter Raum + Aufsichtsraum	1	23,90 m²	23,90 m²
Snoezelraum	1	40,06 m²	40,06 m²
VERWALTUNG			
Lehrerzimmer	1	47,37 m²	47,37 m²
Schul-Büro / Sekretariat	1	23,92 m²	23,92 m²
Büro Schulleitung	1	22,22 m²	22,22 m²
Büro Stellv. Schulleitung	1	14,52 m²	14,52 m²
Raum Berufsorientierung (BOB-Raum)	1	30,01 m²	30,01 m²
Arztraum	1	10,35 m²	10,35 m²
Schwesternzimmer	1	25,23 m²	25,23 m²

Raum	Anzahl	Ø Raumgröße	Flächenbedarf (NUF)
SANITÄRRÄUME			
Behinderten WC SuS unisex	2	9,75 m²	19,50 m²
Behinderten WC SuS M	2	5,59 m²	11,17 m²
Behinderten WC SuS J	2	5,59 m²	11,18 m²
WC SuS unisex	4	5,35 m²	21,40 m²
WC SuS M	1	3,80 m²	3,80 m²
WC SuS J	1	4,59 m²	4,59 m²
WC LuL D	3	4,91 m²	14,73 m²
WC LuL H	3	5,70 m²	17,10 m²
Dusche SuS M	1	12,23 m²	12,23 m²
Umkleide SuS M	1	12,53 m²	12,53 m²
Dusche SuS J	1	12,09 m²	12,09 m²
Umkleide SuS J	1	12,54 m²	12,54 m²
Umkleide LuL unisex	1	5,91 m²	5,91 m²
Pflegebad	5	11,89 m²	59,46 m²
TECHNIK-, LAGER- UND NEBENRÄUME			
Warmküche inkl. Nebenräume	1	49,63 m²	49,63 m²
HWR	1	28,95 m²	28,95 m²
Waschraum	1	8,82 m²	8,82 m²
Lager / PuMi	8	8,27 m²	66,19 m²
SiBe	1	6,01 m²	6,01 m²
NSHV	1	5,89 m²	5,89 m²
Technik	2	5,23 m²	10,46 m²
Serverraum	1	8,96 m²	8,96 m²
SAA / BMA	1	5,42 m²	5,42 m²
NUF (NUTZUNGSFLÄCHE) GESAMT	90		2.188,07 m²

exkl. Untergeschoss

RAUMPROGRAMM VORENTWURFSPLANUNG

Raum	Anzahl	Ø Raumgröße	Flächenbedarf (NUF)
KLASSENEINHEIT			
Klassenraum	12	48,20 m²	578,44 m²
Gruppenraum	12	25,01 m²	300,14 m²
Nebenraum / Differenzierungsraum	4	26,93 m²	107,70 m²
GEMEINSCHAFTSRÄUME			
Sportraum / MZR	1	141,99 m²	141,99 m²
Geräteraum (für Sportraum)	2	36,45 m²	72,90 m²
Theaterraum / Bücherei	1	69,76 m²	69,76 m²
Lehrküche	1	58,69 m²	58,69 m²
Werkraum	1	64,83 m²	64,83 m²
Maschinenraum	1	23,82 m²	23,82 m²
Fahrrad-Reparaturraum	1	48,78 m²	48,78 m²
Musikraum	1	41,95 m²	41,95 m²
Computerraum	1	38,26 m²	38,26 m²
Fachraum Textiles Gestalten	1	47,38 m²	47,38 m²
Pausenraum Unter- & Mittelstufe	1	56,78 m²	56,78 m²
Pausenraum Oberstufe & BPS	1	56,78 m²	56,78 m²
Ausgabetheke Schülercafé	1	16,18 m²	16,18 m²
Kunstraum	1	60,74 m²	60,74 m²
THERAPIE- UND FÖRDERRÄUME			
Krankengymnastik-Raum	1	45,79 m²	45,79 m²
Matschraum & Nebenraum	1	36,88 m²	36,88 m²
Time-Out- / Reizreduzierter Raum + Aufsichtsraum	4	15,96 m²	63,84 m²
Snoezelraum	2	31,77 m²	63,54 m²
im Förderung Kommunikation / Sprachtherapie	1	23,11 m²	23,11 m²
TEACCH-Raum	1	48,41 m²	48,41 m²
Psychomotorikraum	1	77,44 m²	77,44 m²
Therapieräume	2	40,17 m²	80,33 m²
Diagnostikraum	1	32,87 m²	32,87 m²
VERWALTUNG			
Lehrerzimmer	1	76,45 m²	76,45 m²
Schul-Büro / Sekretariat	1	23,92 m²	23,92 m²
Büro Schulleitung	1	22,22 m²	22,22 m²
Büro Stellv. Schulleitung	1	14,52 m²	14,52 m²
Raum Berufsorientierung (BOB-Raum)	1	30,43 m²	30,43 m²
Erste-Hilfe-Raum	1	19,75 m²	19,75 m²

Raum	Anzahl	Ø Raumgröße	Flächenbedarf (NUF)
Schwesternzimmer	1	27,81 m²	27,81 m²
Raum Hausmeister*in	1	25,27 m²	25,27 m²
Besprechungs- / Beratungsraum	2	19,75 m²	39,50 m²
Büro Schulsozialarbeit	1	16,46 m²	16,46 m²
Kopierraum	1	8,82 m²	8,82 m²
Pausenraum Mitarbeiter (Integrationskräfte)	1	48,26 m²	48,26 m²
SANITÄRRÄUME			
Behinderten WC SuS unisex	2	10,46 m²	20,92 m²
Behinderten WC SuS M	3	5,54 m²	16,62 m²
Behinderten WC SuS J	3	5,54 m²	16,61 m²
WC SuS unisex	2	2,59 m²	5,17 m²
WC SuS M	5	3,85 m²	19,23 m²
WC SuS J	5	4,48 m²	22,42 m²
Behinderten WC LuL D	1	11,96 m²	11,96 m²
Behinderten WC LuL H	1	11,96 m²	11,96 m²
WC LuL D	4	5,23 m²	20,91 m²
WC LuL H	4	6,51 m²	26,04 m²
Dusche SuS M	1	12,23 m²	12,23 m²
Umkleide SuS M	1	12,53 m²	12,53 m²
Dusche SuS J	1	12,09 m²	12,09 m²
Umkleide SuS J	1	12,54 m²	12,54 m²
Umkleide LuL unisex	1	5,91 m²	5,91 m²
Pflegebad	6	12,18 m²	73,06 m²
TECHNIK-, LAGER- UND NEBENRÄUME			
Warmküche inkl. Nebenräume	1	49,63 m²	49,63 m²
HWR	1	29,47 m²	29,47 m²
Waschraum	1	8,82 m²	8,82 m²
Lager / PuMi	7	9,79 m²	68,51 m²
SiBe	1	6,01 m²	6,01 m²
NSHV	1	5,89 m²	5,89 m²
Technik	8	19,18 m²	153,47 m²
Serverraum	1	8,96 m²	8,96 m²
SAA / BMA	1	5,42 m²	5,42 m²
Lehrmittel / Lager	6	15,98 m²	95,85 m²
Wäschepflege	1	14,68 m²	14,68 m²
Materialraum Holz	1	22,57 m²	22,57 m²

NUF (NUTZUNGSFLÄCHE) GESAMT **141** **3.380,22 m²**

exkl. Untergeschoss

Raumprogramm im Überblick

entfallene Räume



ENTFALLENE RÄUME

2 Therapieräume • Schülercafe • Turnhalle • Therapiebecken



BGF/Schüler
56 m² / S

Kennwert basierend auf NUF Bedarfsermittlung
und vorhandenen Flächen im Bestandsgebäude



Brutto-Grundfläche BGF - 5.904 m²

Konstruktions-Grundfläche KGF
Verkehrsfläche VF
Technikfläche TF

2.524 m²

Nutzungsfläche NUF

3.380 m²



Da das Untergeschoss von der Unteren Wasserbehörde als nicht nutzbar eingestuft wird, werden hier ausschließlich die oberirdischen Flächenkennwerte aufgeführt.

Vergleichsobjekte & Referenzen

Geplante Schulen in der Region und Referenzobjekte im Vergleich


GEPLANTE SCHULEN IN DER REGION

Schule	Baujahr	Maßnahme	Förderschwerpunkt	Schüler	BGF [m²]	BGF/Schüler
Hans-Verbeek-Schule	–	Erweiterung / Neubau	Geistige Entwicklung (GE)	150	5.305	35,00
Matthias-Hagen-Schule	–	Erweiterung / Neubau	Emotionale & soziale Entwicklung, Sprache	245	6.075	25,00
St-Nikolaus-Schule	–	Sanierung + Erweiterung	Geistige Entwicklung (GE)	105	5.904	56,00


REFERENZOBJEKTE

Schule	Baujahr	Maßnahme	Förderschwerpunkt	Schüler	BGF [m²]	BGF/Schüler
Hans-Thoma-Schule	2019	Neubau	Lernen / körperl.-motorische Entwicklung	250	9.800	39,20
Astrid-Lindgren-Schule	2027/28	Neubau	Geistige Entwicklung (GE)	180	9.000	50,00
Christoph-Gaupner-Schule	2025	Sanierung + Erweiterung	Geistige & motorische Entwicklung	190	7.900	41,60
Förderschule Auf dem Sandberg	2022	Erweiterung / Neubau-Anbau	Geistige Entwicklung (GE)	240	–	–
Panke-Schule	2023	Neubau	Geistige Entwicklung (GE)	152	8.700	57,20
Spree-Regine-Hildebrandt-Schule	2027/28	Neubau	Geistige Entwicklung (GE), inkl. Therapie	192	8.575	44,70
Schule am Wasserwerk	2026	Neubau	Geistige Entwicklung (GE)	132	8.300	62,90
Sonderpädagog. Förderzentrum Unterhaching	2018	Neubau + Umstrukturierung + Erweiterung	Gemischter Förderzentrum-Campus	250	12.700	50,80
Förderschule GE Meinersen	2025	Neubau	Geistige Entwicklung (GE)	168	–	–
LVR-Kurt-Schwitters-Schule	2021	Erweiterung + Sanierung	Sprache, SEK I	192	5.702	29,70


Grundriss Untergeschoss

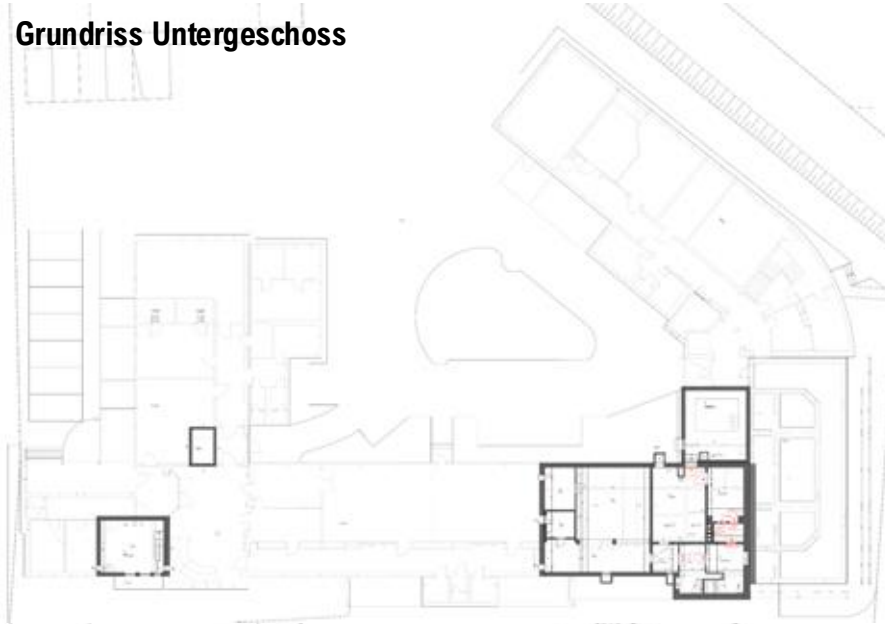

Grundriss 1.Obergeschoss

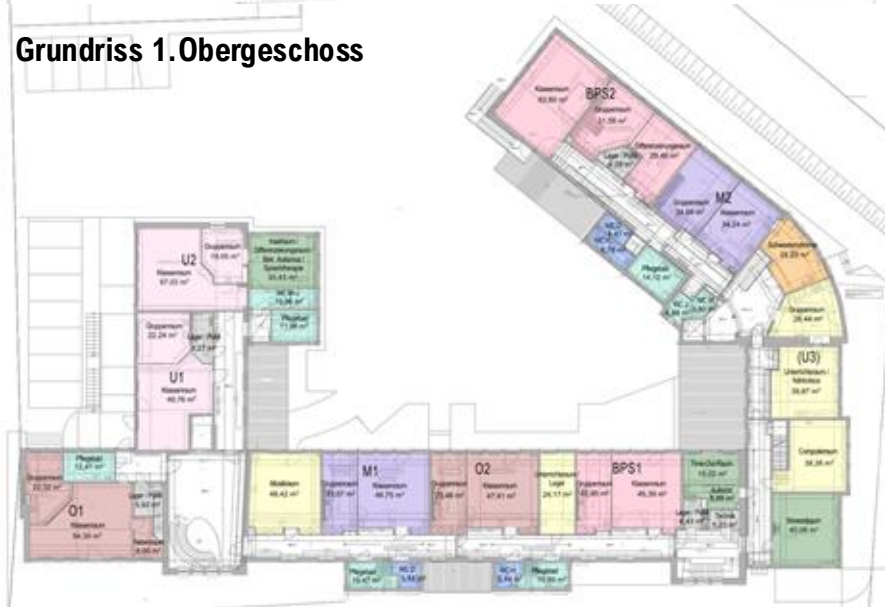

Grundriss Erdgeschoss

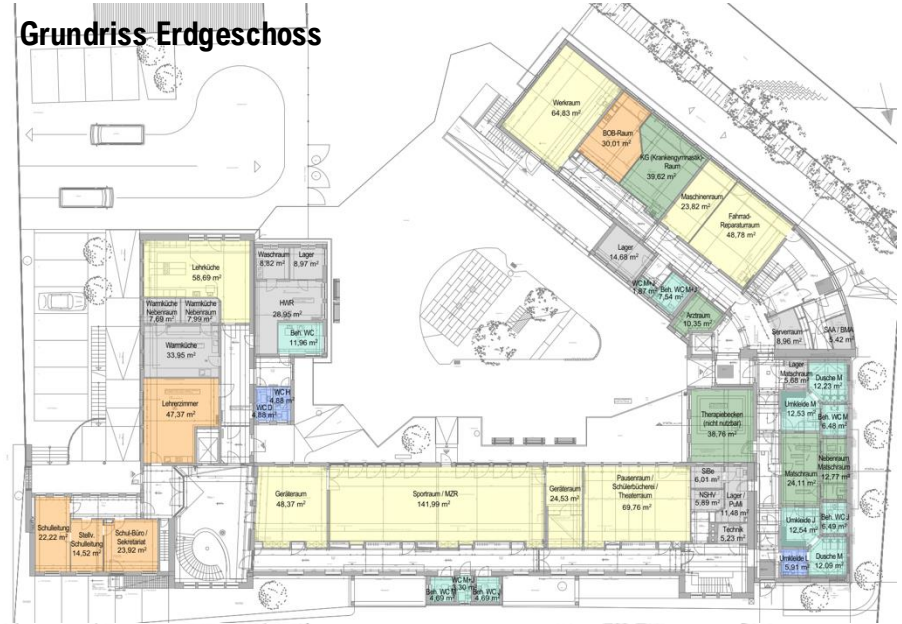


Grundriss 2.Obergeschoss



VORENTWURFSPLANUNG

Grundriss Untergeschoss

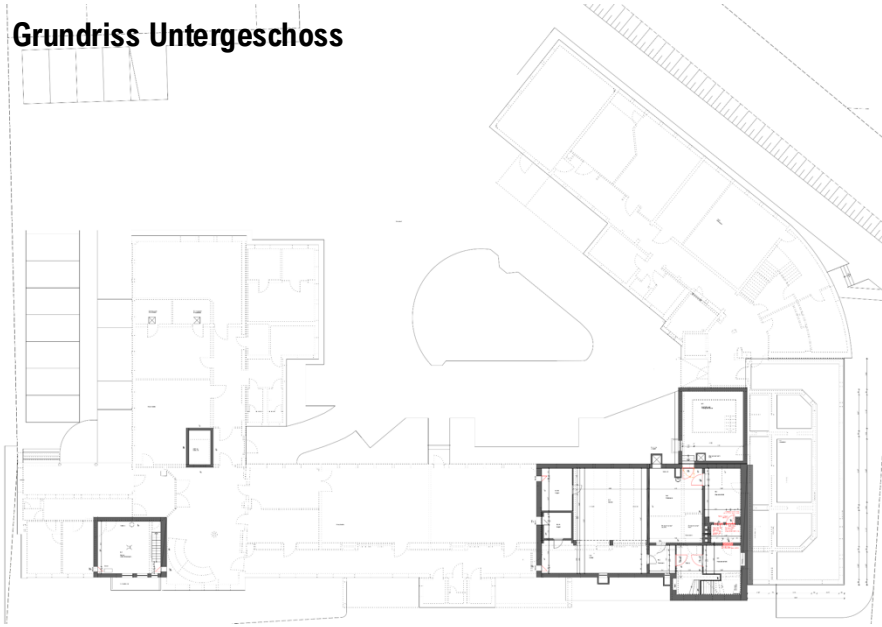

Grundriss Erdgeschoss



Grundriss 1.Obergeschoss



Grundriss 2.Obergeschoss





ENERGETISCHE SANIERUNG KOMMUNALER GEBÄUDE

Teil der **Klimaschutzförderung** im Rheinisches Revier

Ziel: **CO₂-Reduktion**, **Energieeinsparung** und **Senkung von Betriebskosten** im kommunalen Gebäudebestand

Förderfähig: nicht wirtschaftlich genutzte **kommunale Gebäude**

Mindestvolumen: 100.000 € pro Vorhaben

Einreichung des Förderantrags im Rahmen von **Förderstrang 1 (Gesamtmaßnahme)** oder **2 (Einzelmaßnahmen)**

FÖRDERSTRANG 2:

Kombination einzelner energetischer Sanierungsmaßnahmen an kommunalen Gebäuden

Ziel: **Niedertemperatur-Readiness**

Fokus auf Gebäudehülle, technische Gebäudeausrüstung und Optimierung bestehender Systeme


Förderfähig sind investive Maßnahmen inkl. **Planungs- und Baubegleitleistungen sowie Umfeldmaßnahmen** (durch energetische Sanierung verursachte bzw. erforderliche bauliche Anpassungen im unmittelbaren Gebäudeumfeld)

Keine Förderung von Personal- oder Verwaltungskosten

TERMINSCIENE:


Bewilligung der eingereichten Förderanträge bis Ende 2026 (Fördertopf aktuell frühzeitig geschlossen)

Baufertigstellung inkl. Schlussrechnung bis Ende 2029

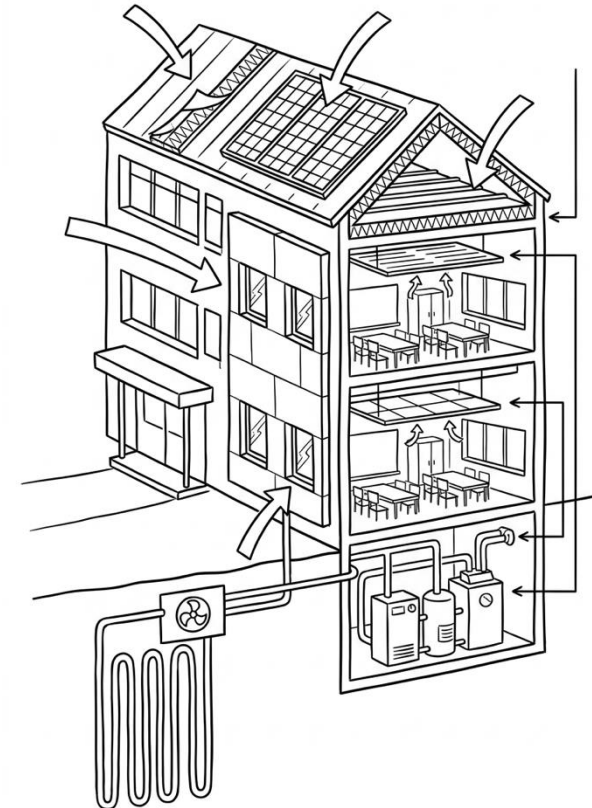


BAULICHE SANIERUNGSMABNAHMEN

Bauteil	Bestand	Energetische Sanierung
Fassade	überwiegend ungedämmt	Ganzheitliche Fassadendämmung
Dach	teilweise gedämmt	Ganzheitliche Dämmung
Bodenplatten	ungedämmt	Dämmung gegen luftberührte Bereiche (Kriechkeller + Keller)
Geschossdecken	-	-
Fenster und Außentüren	U-Werte überwiegend = 3,0 bis 2,7 W/(m ² K)	U-Werte = 0,94 W/(m ² K), Reduktion der Fenstergrößen
Kubatur	gewachsene Struktur, Vor- und Rücksprünge	geschlossene Fassade, Optimierung A-V-Verhältnis
Sonnenschutz	außenliegende Raffstores (defekt) an NUF	Austausch außenliegende Raffstores flächendeckend

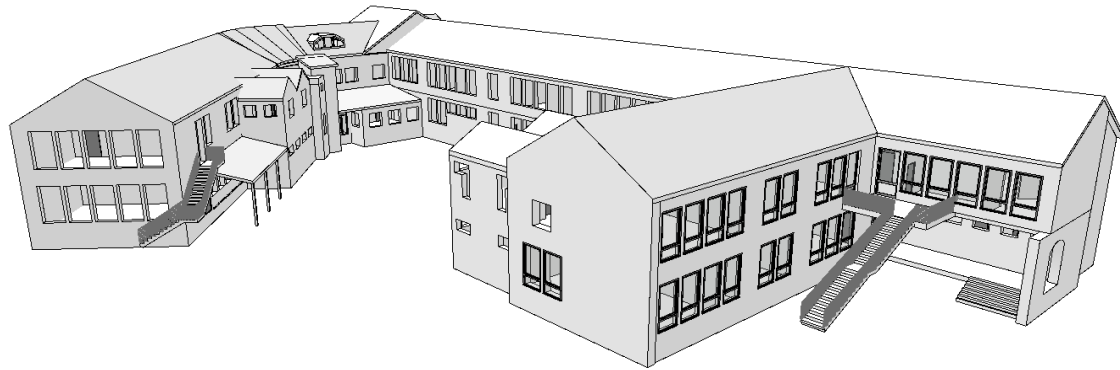

Bestand

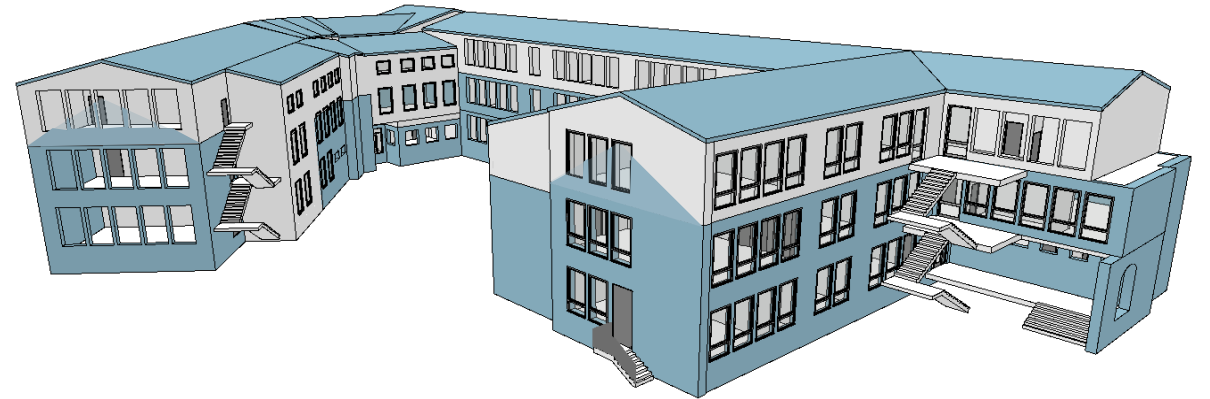


Energetische Sanierung

BAULICHE SANIERUNGSMABNAHMEN

Bauteil	Bestand	Energetische Sanierung
Fassade	überwiegend ungedämmt	Ganzheitliche Fassadendämmung
Dach	teilweise gedämmt	Ganzheitliche Dämmung
Bodenplatten	ungedämmt	Dämmung gegen luftberührte Bereiche (Kriechkeller + Keller)
Geschossdecken	-	-
Fenster und Außentüren	U-Werte überwiegend = 3,0 bis 2,7 W/(m ² K)	U-Werte = 0,94 W/(m ² K), Reduktion der Fenstergrößen
Kubatur	gewachsene Struktur, Vor- und Rücksprünge	geschlossene Fassade, Optimierung A-V-Verhältnis
Sonnenschutz	außenliegende Raffstores (defekt) an NUF	Austausch außenliegende Raffstores flächendeckend




Bestand

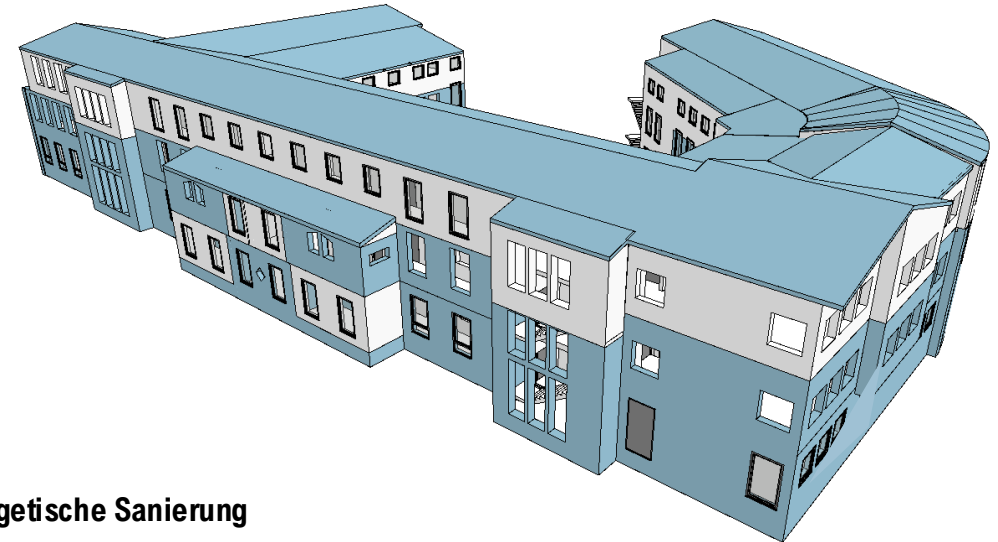


Energetische Sanierung

BAULICHE SANIERUNGSMABNAHMEN

Bauteil	Bestand	Energetische Sanierung
Fassade	überwiegend ungedämmt	Ganzheitliche Fassadendämmung
Dach	teilweise gedämmt	Ganzheitliche Dämmung
Bodenplatten	ungedämmt	Dämmung gegen luftberührte Bereiche (Kriechkeller + Keller)
Geschossdecken	-	-
Fenster und Außentüren	U-Werte überwiegend = 3,0 bis 2,7 W/(m ² K)	U-Werte = 0,94 W/(m ² K), Reduktion der Fenstergrößen
Kubatur	gewachsene Struktur, Vor- und Rücksprünge	geschlossene Fassade, Optimierung A-V-Verhältnis
Sonnenschutz	außenliegende Raffstores (defekt) an NUF	Austausch außenliegende Raffstores flächendeckend

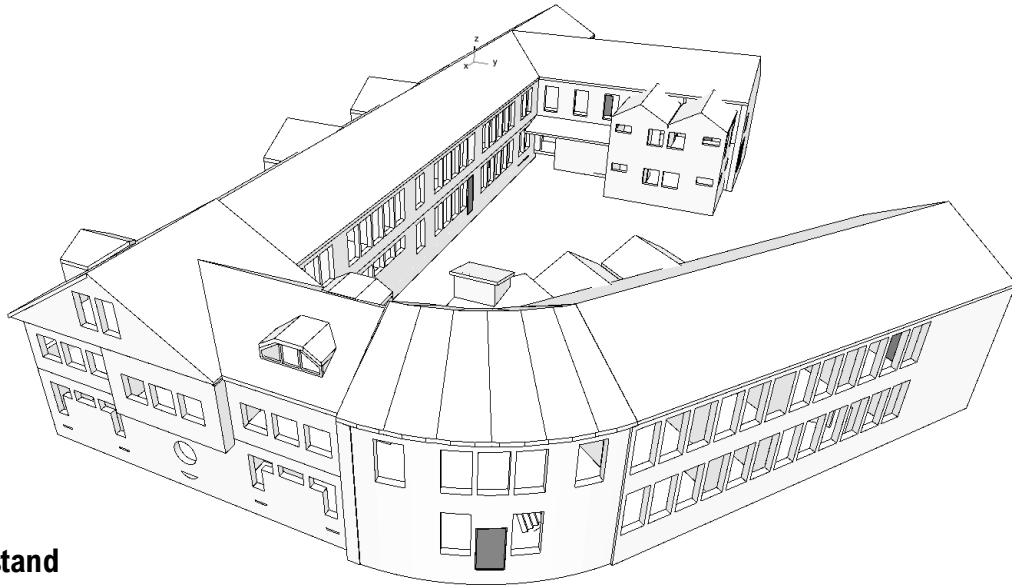

Bestand

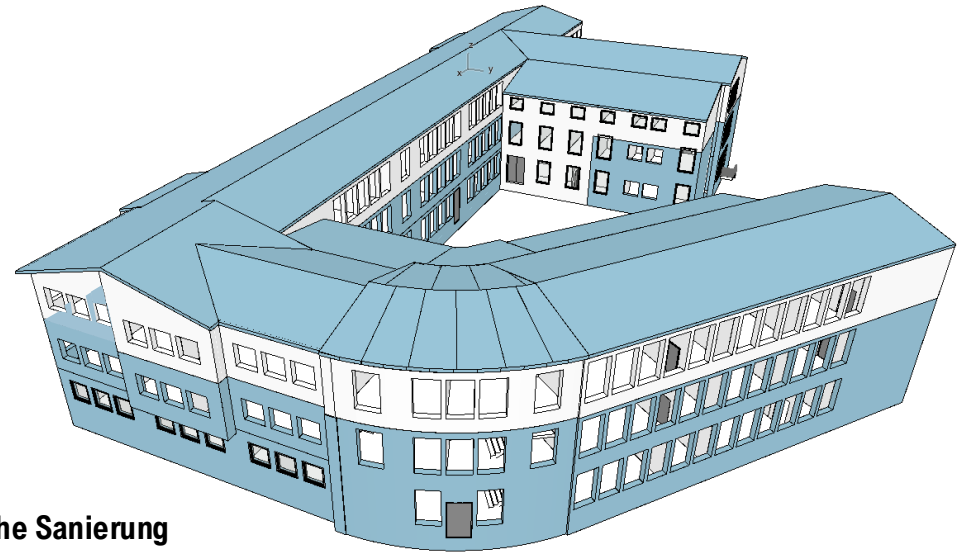

Energetische Sanierung




TECHNISCHE SANIERUNGSMABNAHMEN


Bauteil	Bestand	Energetische Sanierung
Heizung	Gasheizung	Geothermie (Sole-WP, ggfs. in Kombination mit Luft-Wasser-WP)
Heizüberträger	Heizkörper (Teilbereich: Fußbodenheizung)	Heiz- und Kühl- Abhangdecken
Lüftung	Fenster	dezentrale Lüftungsgeräte in Klassen- und Aufenthaltsräumen
Technikräume	teilw. UG (Überflutungsbereich), prov. im EG (Entfall Fachräume)	Technikanlagen hochwassersicher (in Aufstockung)

Bestand



Energetische Sanierung

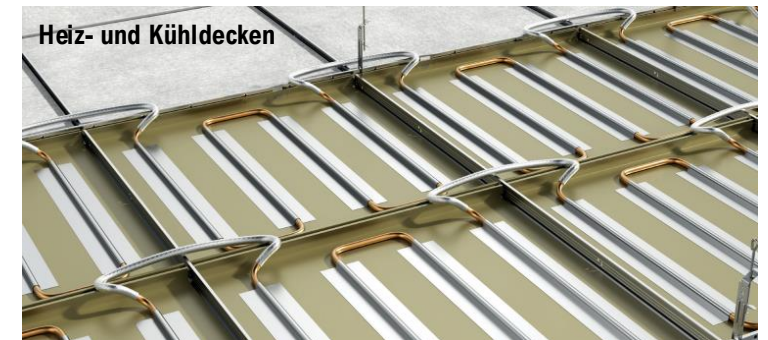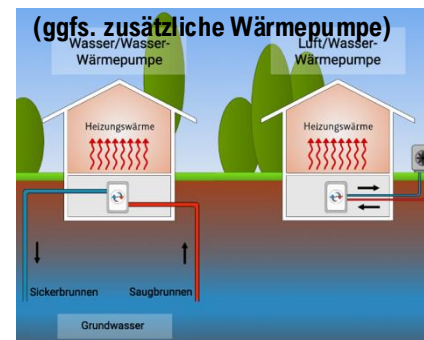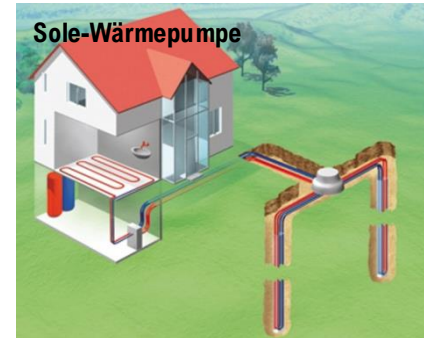

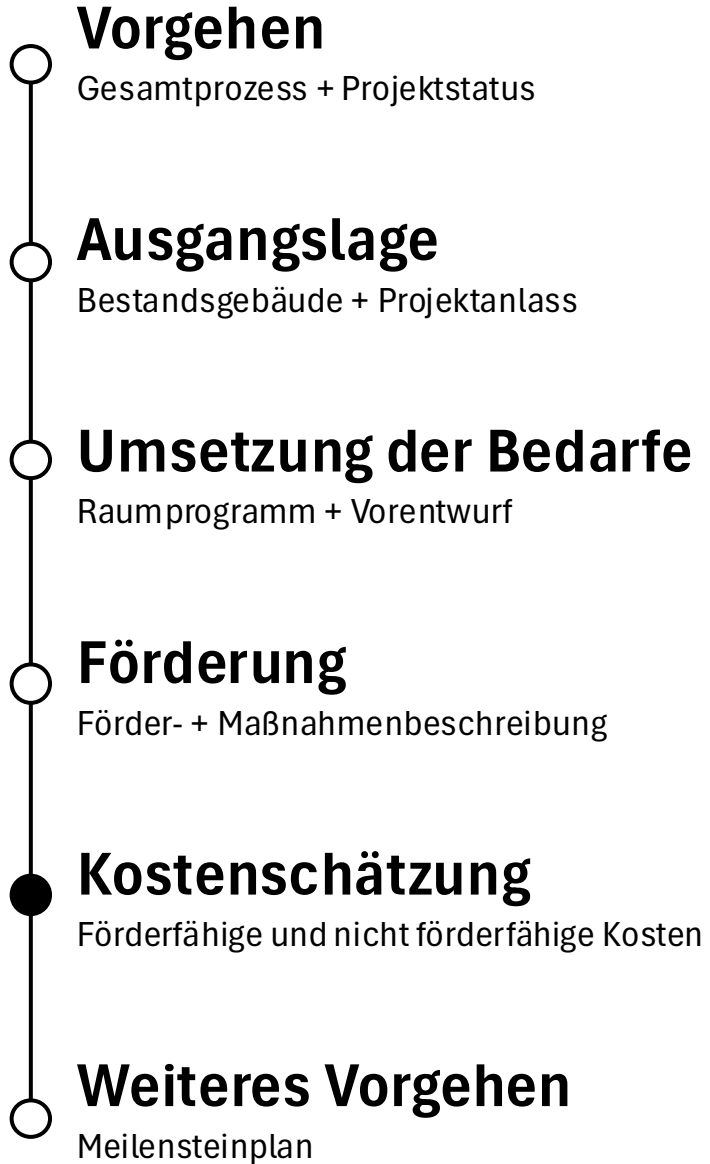


KOSTENSCHÄTZUNG

	Voraussichtlich förderfähige Kosten netto (Kosten gem. Förderantrag)	Nicht förderfähige Kosten netto	Gesamtvorhaben Kosten
KG 100 - Grundstück	-	-	-
KG 200 - Herrichten und Erschließung	22.500,00 €	-	22.500,00 €
KG 300 - Bauwerk-Baukonstruktionen	12.772.939,20 €	555.474,00 €	13.328.413,20 €
KG 400 - Bauwerk-Technische Anlagen	4.246.300,30 €	300.300,00 €	4.546.600,30 €
KG 500 - Außenanlagen	500.000,00 €	-	500.000,00 €
KG 600 - Ausstattung und Kunstwerke	-	-	-
KG 700 - Baunebenkosten	3.565.054,94 €	173.494,80 €	3.738.549,74 €
Gesamtkosten netto	21.106.794,44 €	1.029.268,80 €	22.136.063,24 €
Gesamtkosten brutto	25.117.085,38 €	1.224.829,87	26.341.915,25 €




Die voraussichtlich förderfähigen Kosten basieren auf den im Förderantrag ausgewiesenen Kosten und umfassen eine Vielzahl von Umfeldmaßnahmen. Es besteht das Risiko, dass nicht alle eingereichten Maßnahmen bewilligt werden oder Fördermittel nachträglich zurückgezahlt werden müssen.

Die Kosten für eine Interimsschule in Höhe von ca. 4.500.000 € (netto) sind in der KG 300 enthalten.

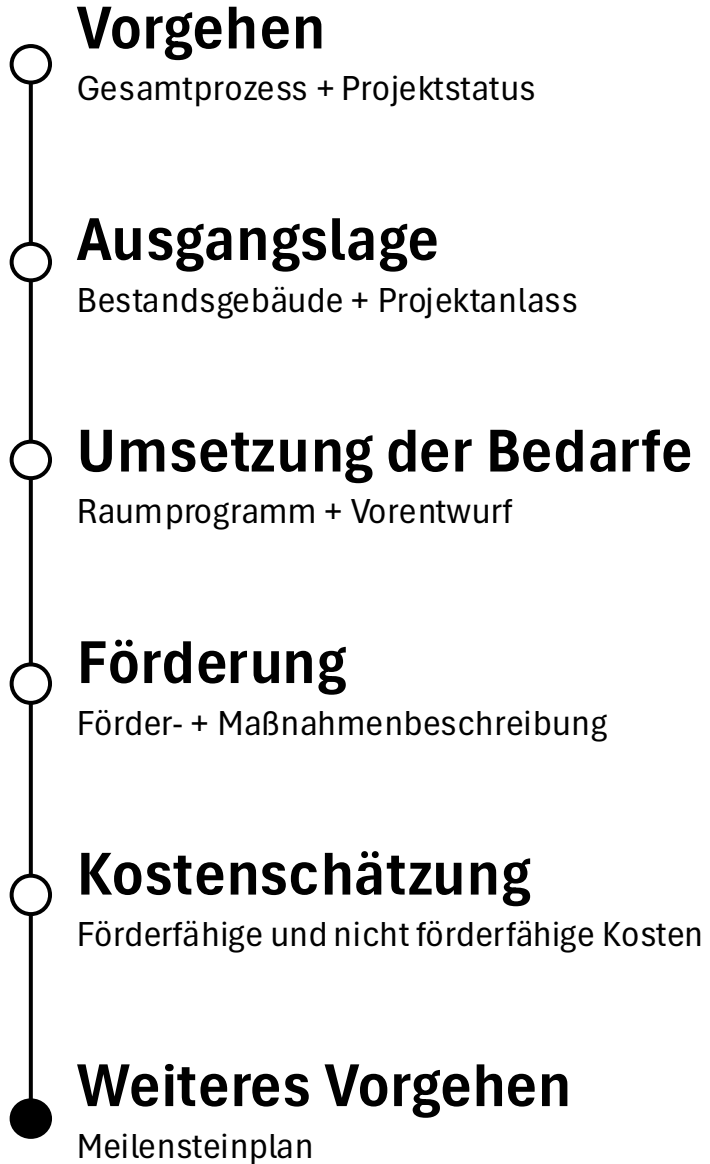

WEITERES VORGEHEN

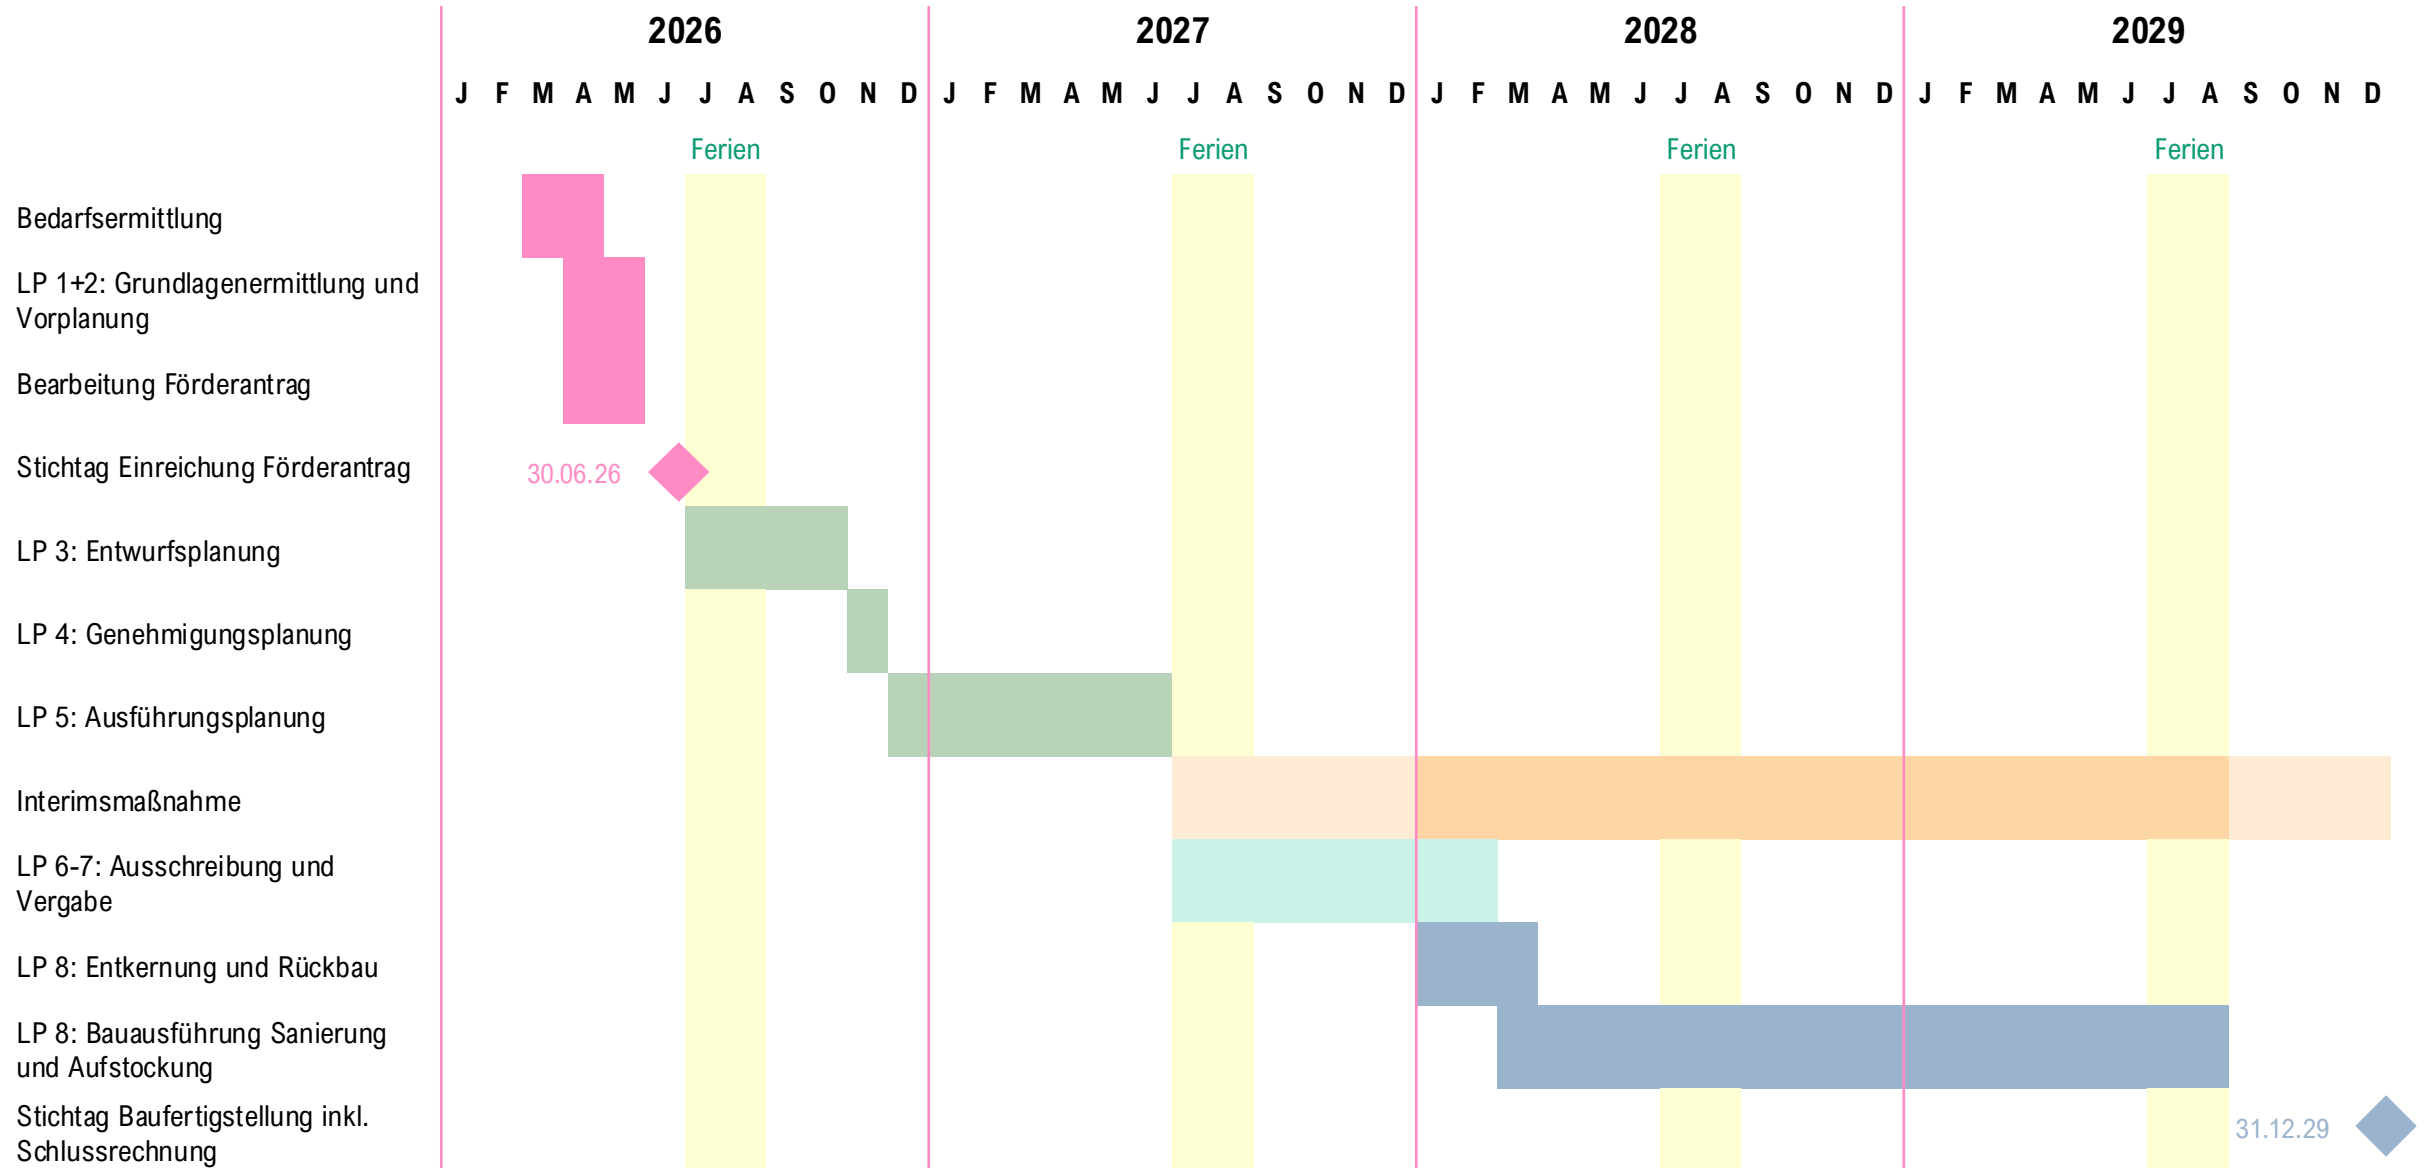

VIELEN DANK



DERICHS u KONERTZ Planung GmbH

Oranienstraße 27-31, 52066 Aachen

planung@derichsukonertz.de
www.derichsukonertz.de

Tel. +49 241 51808 0
Fax +49 241 51808 64
